

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

INFORME FINAL VISITA FISCAL

RECURSOS CREDITO EXTERNO

DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL –SED

VIGENCIA: 2012 – 2013 - 2014

Elaboró: SONIA ESPERANZA SUA FIGUEROA
Gerente 039-01

JAIME ROMERO NEUTA
Profesional Universitario 219-03
LUIS FRANCISCO ROBAYO TORRES
Profesional Universitario 219-03 (E)

Aprobó: Dra. MARIA GLADYS VALERO RIVAS
Directora Técnica Sector Educación, Cultura, recreación y Deporte

Diciembre, 18 de 2014

TABLA DE CONTENIDO

1. CARTA DE CONCLUSIONES.....	3
1.1. ASPECTOS GENERALES.....	6
1.2. SEGUIMIENTO TECNICO	6
1.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS 2012 -2014.....	6
1.3.1. Proyecto de inversión 262 - hábitat escolar	7
1.3.1.1. <i>Componente 1. Construcción infraestructura educativa</i>	7
1.3.1.2. <i>Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto se modificó la obra del bloque 8 del colegio distrital “VENECIA” que había sido aprobada en la licencia de construcción revalidada.....</i>	14
1.3.2. Componente 2. Aumento de la retención y la graduación	19
1.3.2.1. <i>Subcomponente 2.1 Subsidios Condicionados Educación Básica</i>	19
1.3.2.2. <i>Subcomponente 2.2 Subsidios Condicionados Educación Superior, Técnica y Tecnológica.....</i>	20
1.3.3. Componente 3. Mejoría de la calidad	22
1.3.3.1. <i>Subcomponente 3.1 Recursos para el Aprendizaje Adecuados y Utilizados.....</i>	22
1.3.3.2. <i>Subcomponente 3.2 Programa de Desarrollo Profesional Docente y Directivo</i>	22
1.3.4. Gastos operativos	23
1.3.5. Seguimiento financiero.....	24
Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados.	25
1.3.5.1. <i>Hallazgo administrativo por la periodicidad en la ejecución de los recursos externos.....</i>	25
1.3.5.2. <i>Adquisición de bienes y servicios 2014</i>	29
1.4. EJECUCION PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS 2012 -2014 BIRF ..	29
1.4.1. Estructura del programa.....	30
1.4.1.1. <i>COMPONENTE B.....</i>	30
1.4.1.1.1. <i>Obras de Mitigación del Riesgo.....</i>	30
1.4.1.1.2. <i>Compromisos por pagar B.1.1 mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales.</i>	34
1.4.2. Componente D.....	34
1.4.2.1. <i>Educación Del Riesgo</i>	34
2. ANEXO 1.....	37
3. ANEXOS.	40
3.1. CUADRO DE HALLAZGOS CONSTITUTIVAS DE PRESUNTOS	40

1. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor
OSCAR GUSTAVO SANCHEZ
Representante legal
Secretaría de Educación Distrital - SED
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó visita fiscal a la Secretaría de Educación Distrital, vigencias 2012 a 2014, a través de la evaluación de los principios de eficiencia y eficacia con que administró los recursos de crédito externo y los resultados de su gestión en la ejecución de los mismos.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de visita fiscal que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la visita fiscal adelantada, no emite concepto en términos de eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos de crédito externo (BID – BIRF) que se invirtieron en los proyectos de inversión, toda vez que se trata de un primer informe que no permite evidenciar hechos que conlleven a emitir un concepto, recursos sobre los cuales se seguirá evaluando por parte del ente de control.

Teniendo en cuenta que esta evaluación se realizó a través de visita fiscal, el alcance se limitó a un diagnóstico en la asignación de estos recursos.

Es de señalar que la Contraloría de Bogotá mediante el Ejercicio del Control Fiscal efectuó auditorías a partir de 2006 donde realizó seguimiento a la contratación suscrita con crédito externo (Infraestructura Educativa), en donde se evidenciaron inconsistencias que dieron origen a una serie de hallazgos administrativos con incidencia fiscal, penal y disciplinaria que fueron comunicados en su oportunidad a los entes competentes.

Es importante precisar que los recursos asignados para las vigencias 2012, 2013 y 2014 presentan el siguiente comportamiento:

- En el 2012, por parte del BID se apropiaron recursos por valor de \$643.699.825 para los proyectos de inversión 200 y 902. No se asignaron recursos por parte del BIRF en esta vigencia.

En el 2013 se asignaron recursos por valor de \$1.300.000.000 con cargo al crédito BID para la construcción de la institución educativa “VENEZIA”.

En el 2014 no hubo asignación de recursos de crédito externo.

En consideración a lo antes anotado esta auditoría efectuó un diagnóstico en el historial del comportamiento de la ejecución de recursos de crédito externo (BID y BIRF) desde la fecha de suscripción de los contratos de préstamo.

Como resultado de la auditoría se evidenciaron dos (2) hallazgos administrativos, uno (1) con presunta incidencia disciplinaria, relacionada con el incumplimiento a lo aprobado en la licencia de construcción de la institución educativa “VENEZIA” revalidada y modificando los diseños y posteriormente la construcción realizada no correspondiendo con la licencia original.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Igualmente, para este ente de control llama la atención el hecho de que hayan transcurrido ocho (8) años desde la fecha de la firma de los contratos de préstamo de crédito externo, y aun se encuentren en proceso solicitudes de reembolso, lo que podría generar posibles sobrecostos en pago de intereses, constituyéndose en un hallazgo administrativo.

PLAN DE MEJORAMIENTO

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, (dentro de la vigencia), documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá en medio físico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las acciones que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución, garantizando que busque eliminar la causa del hallazgo, que sea realizable, medible, contribuya a su objeto misional, propicie el buen uso de recursos públicos, el mejoramiento de la gestión institucional y atienda los principios de la gestión fiscal.

Es importante dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo 1 del artículo 4º de la Resolución Reglamentaria 03 de octubre 16 de 2012 que señala *“En el evento que se formule un nuevo plan, éste debe contemplar las acciones en ejecución y abiertas del plan de mejoramiento anterior. Aquellas acciones del plan anterior que no fueron ejecutadas en el tiempo previsto, se incluirán en el plan de mejoramiento con un plazo de ejecución no superior a sesenta (60) días. Cuyo cumplimiento es imprescindible so pena de las sanciones previstas”*.

Cordialmente,



MARIA GLADYS VALERO VIVAS

Director Técnico Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

RESULTADOS OBTENIDOS.

1.1. ASPECTOS GENERALES

El Distrito, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” 2008-2012 estableció políticas y metas para el desarrollo del sector educativo.

Para garantizar el cumplimiento de estas políticas y metas el Distrito acudió al Sistema Financiero Internacional – Banco Interamericano de Desarrollo “BID” en la consecución de un préstamo que garantizara los recursos para el avance en el desarrollo de las líneas generales planteadas en el Plan Sectorial. En este sentido, en el año 2006 se celebró el contrato de préstamo BID 1812/OC-CO por US\$ 60.000.000 de dólares (\$127.110.723.176,43 pesos), y un préstamo BIRF 7365-CO con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por US\$29.000.000 de dólares, para un total de recursos de crédito externo de US\$121.695.670 dólares.

1.2. SEGUIMIENTO TECNICO

Se verificaron las Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital – EBI, de los proyectos 262, 200 y 902 por las vigencias 2012, 2013 y 2014, observando que dichos proyectos fueron registrados en el Banco Distrital de Programas y Proyectos. Así mismo dichos proyectos cuentan con el respectivo concepto de viabilidad.

1.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS 2012 -2014

Bajo el programa de “Equidad en Educación en Bogotá” se ejecutaron los siguientes proyectos de inversión con recursos del crédito externo:

CUADRO 1
PROYECTOS DE INVERSIÓN - CREDITO EXTERNO - BID & BIRF 2012 -2013

(Cifras en miles de pesos)

VIGENCIA	PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	FUENTE DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE
2012	200	Fortalecimiento de la gestión institucional de la SED	Acceso y Permanencia a la Educación	137-Crédito BID 1812/OC	623.699
	262	Hábitat Escolar	03 Construcción de Saberes. Educación Incluyente, Diversa y de Calidad para Disfrutar y Aprender	137-Crédito BID 1812/OC	1.300.000
				23-Contrapartida Banco Mundial	825.224

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

VIGENCIA	PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	FUENTE DE INVERSION	APROPIACIÓN DISPONIBLE
				124--Crédito BIRF	4.151.711
	902	Mejor Gestión	Mejor Gestión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana	137-Crédito BID 1812/OC	20.966
2013	902	Mejor Gestión	Mejor Gestión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana	137-Crédito BID 1812/OC	20.967
	262	Hábitat Escolar	Programa 03 Construcción de Saberes. Educación Incluyente, Diversa y de Calidad para Disfrutar y Aprender	137-Crédito BID 1812/OC	1.300.000
TOTAL					8.242.568

Fuente: Documento SED - R.N. S-2014-179200

Para la vigencia de 2014 no se apropiaron recursos por créditos externos en el presupuesto de la Secretaría de Educación.

Es de precisar que los \$8.242.568 mil pesos corresponden a las vigencias 2012 y 2013 y que representan el 6,48% de los recursos del crédito con el BID y BIRF.

1.3.1. Proyecto de inversión 262 - hábitat escolar

Objetivo general: Construir, dotar y poner en funcionamiento la infraestructura educativa necesaria para garantizar el derecho a la educación y la prestación del servicio educativo a los niños, niñas y adolescentes en los niveles de preescolar, básica y media.

1.3.1.1. Componente 1. Construcción infraestructura educativa

Subcomponente 1.1 Construcción de Colegios

El objetivo de este subcomponente fue la construcción de 20 colegios nuevos y su completa dotación, lo cual permitió la ampliación de la oferta educativa en 61.100 nuevos cupos.

La meta del Programa, tener 20 colegios construidos y dotados, dicha dotación se ha efectuado en las aulas que han sido entregadas. Hasta la fecha, de los veinte (20) colegios, se han entregado y dotado diecinueve (19) con recursos del crédito externo y contrapartida (SED). El colegio restante (Institución Educativa Venecia) se encuentra en etapa de ejecución y se tiene prevista su entrega para el 19/12/2014.

A continuación se indica los 19 colegios construidos con recursos de crédito externo:

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

**CUADRO 2
COLEGIOS CONSTRUIDOS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO**

Contrato	Nombre del Lote / Proyecto	Nombre del Colegio	% de Ejecución Física	FECHA DE TERMINACION
089/06	CIUDAD DE VILLAVICENCIO - PREDIO PUERTA AL LLANO	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	100%	02/07/2008
106/06	ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN - PREDIO PORTAL DEL SOL	ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN	100%	14/02/2008
115/06	FRANCISCO SOCARRAS - PREDIO JARDINES LA LIBERTAD	FRANCISCO SOCARRAS	100%	29/07/2008
245/06	CIUADADELA EDUCATIVA DE BOSA - CIUADADELA EL PORVENIR	CIUADADELA EDUCATIVA DE BOSA	100%	07/10/2008
117/06	VIRGINIA GUTIÉRREZ - TTES DE COLOMBIA	VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	100%	20/05/2009
085/06	LAS MERCEDES	NICOLAS BUENAVENTURA	100%	24/04/2009
107/06	JOSE MARIA VARGAS - PREDIO LAS MARGARITAS BELLA FLOR	JOSE MARIA VARGAS VILA	100%	01/12/2008
108/06	CUNDINAMARCA - PREDIO LA RIVERA DEL SUR	CUNDINAMARCA	100%	14/06/2008
114/06	ANTONIO GARCIA - PREDIO INÉS ELVIRA LADRILLERA DEL SUR	ANTONIO GARCÍA	100%	29/05/2008
190/05	HOLANDA LA LIBERTAD	ORLANDO HIGUITA	100%	29/06/2007
205/06	DEBORA ARANGO - PREDIO CLARA FE Y LA PAZ	DEBORA ARANGO	100%	18/08/2008
126/06	GUSTAVO ROJAS PINILLA - PREDIO LA PAMPA -LA MONTANA	GUSTAVO ROJAS PINILLA	100%	07/09/2006
243/06	MOCHUELO - CLAVEL LOTE 3	JOSE CELESTINO MUTIS	100%	13/10/2009
116/06	VILLAS DEL DIAMANTE	FANNY MICKEY	100%	28/02/2010
195/06	VILLA DIANA	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	100%	30/04/2010
087/06	LÍBANO II SECTOR (Chico sur)	FERNANDO GONZÁLEZ	100%	09/01/2014
086/06	GERMAN ARCINIEGAS - PREDIO BRASIL LÓPEZ QUINTANA	GERMAN ARCINIEGAS	100%	18/12/2012
157/06	TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA - PREDIO LITUANIA EBENEZER	TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	100%	21/05/2013
092/06	RAMON DE ZUBIRIA -RINCON LA PALMA	RAMON DE ZUBIRIA	100%	30/04/2014

Fuente: Planeación SED

La apropiación de recursos del crédito externo “BID” fue el siguiente para este componente:

**CUADRO 3
PRESUPUESTO DISPONIBLE COMPONENTE 1**

Cifras en miles de pesos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN COMPONENTE	COMPROMISOS (RP) A 22-06-14	
			BID	LOCAL
I	1.1	Construcción y Dotación Colegios	90.592.616	83.237.730
Total I CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			90.592.616	83.237.730

Fuente: SED – Ejecución Presupuestal

Este componente tuvo una participación del 46,44% del total del crédito con el BID; por su parte la SED participo con recursos propios del orden del 22,33% como contrapartida en el crédito del BID.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

La ejecución de los recursos antes anotados para este componente fue el siguiente:

**CUADRO 4
EJECUCIÓN RECURSOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Cifras en miles de Pesos

COMPONENTE	COMPROMISOS (RP) A 22-06-2014		EJECUCION Y PAGOS A 22-06-2014		TOTAL INVERSIÓN
	BID	SED	BID	SED	BID - SED
Construcción y Dotación Colegios	90.592.616	78.976.399	86.899.844	78.976.399	165.876.244

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014

De los recursos apropiados del crédito externo “BID” se ha ejecutado el 95,9% en infraestructura y dotación de colegios quedando pendiente por ejecutar el 4.1% equivalente a \$5.394.749 mil pesos. Los compromisos por pagar al BID con corte al 22 de junio de 2014 suman \$3.692.772 mil pesos.

La SED aclaro que en los compromisos por pagar componente 1.1, se hizo ajuste por valor de \$ 3.440.763 mil pesos, así: \$32.422 mil pesos recursos crédito y \$3.408.340 mil pesos recursos de contrapartida, correspondiente a actas Nos. 1 y 2 de anulación según Oficio de la Oficina de presupuesto de junio de 2011- Contratos Liquidados. De los recursos apropiados para este componente queda pendiente un saldo por justificar al BID de \$1.701.497 mil pesos.

Recursos en Ejecución

Mediante Resolución No. 051 del 7 de marzo de 2013, se adjudicó Contrato de Obra 2064 de 2013 suscrito entre la SED y el CONSORCIO OBRAS VENECIA 2013 para la construcción del colegio Venecia de la localidad de Tunjuelito, al contratista Consorcio Obras Venecia 2013 por un valor inicial de \$3.659.636 mil pesos; como se muestra en detalle en el siguiente cuadro:

**CUADRO 5
CONTRATO DE OBRA 2064/2013**

CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS VENECIA 2013
VALOR INICIAL	\$ 3.659.636.234
VALOR ADICIÓN	\$ 1.328.689.995
VALOR FINAL	\$ 4.988.326.229
OBJETO	Ejecución de las obras necesarias y complementarias para la terminación del edificio del costado norte en el Colegio Venecia de la localidad 6ª de Tunjuelito, de acuerdo con los planos especificaciones y cantidades de obra entregados por la SED.
PLAZO INICIAL	11 meses
FECHA INICIACIÓN	02 de septiembre de 2013


“Por un control fiscal efectivo y transparente”

FECHA TERMINACIÓN INICIAL	01 de Agosto de 2014
PLAZO ADICIONAL	120 días calendario
TIEMPO SUSPENDIDO	20 días calendario
FECHA FINAL	19 de Diciembre de 2014

Fuente: Oficina de Planeación - SED

Según informe mensual presentado por la interventoría, en la gráfica se indica la inversión total de los recursos con corte al 21 de noviembre de 2014:

**GRAFICA 01
INVERSIÓN TOTAL
CONTRATO DE OBRA 2064/2013**

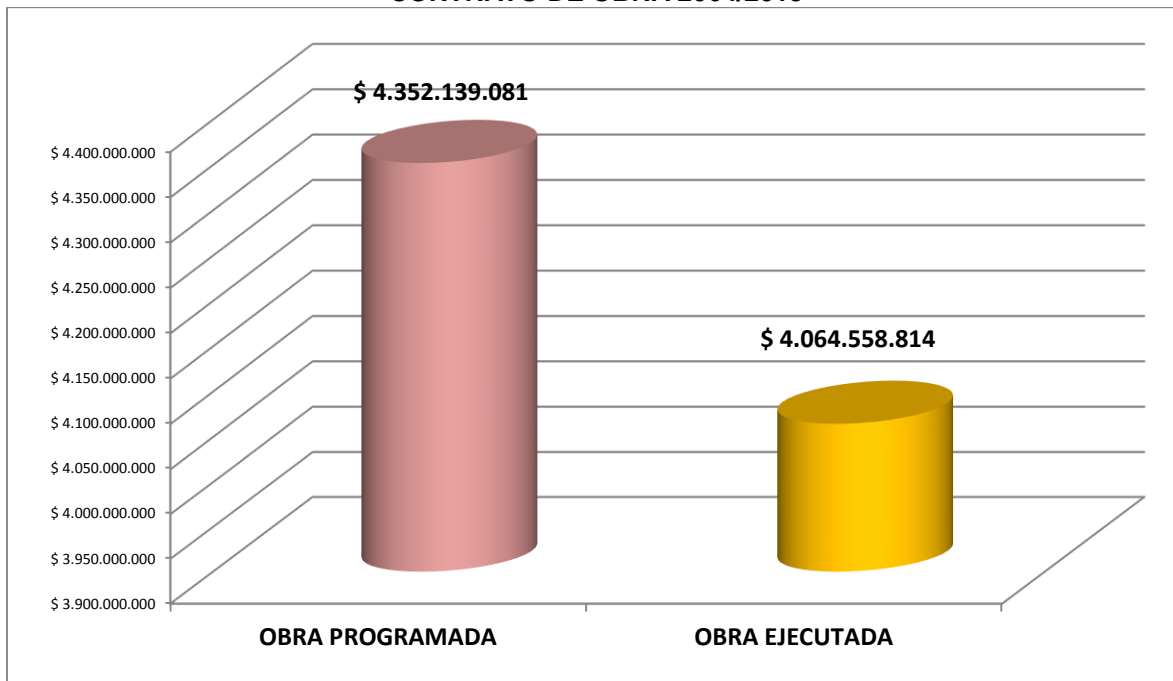


En la gráfica, se observa el comparativo de la programación en la inversión total de los recursos en desarrollo del contrato 2064/13, de lo programado frente a lo ejecutado, representando una ejecución del 93.4%.

A continuación se indica el avance físico de la obra del contrato 2064/13:

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

GRAFICA 01
AVANCE FISICO
CONTRATO DE OBRA 2064/2013

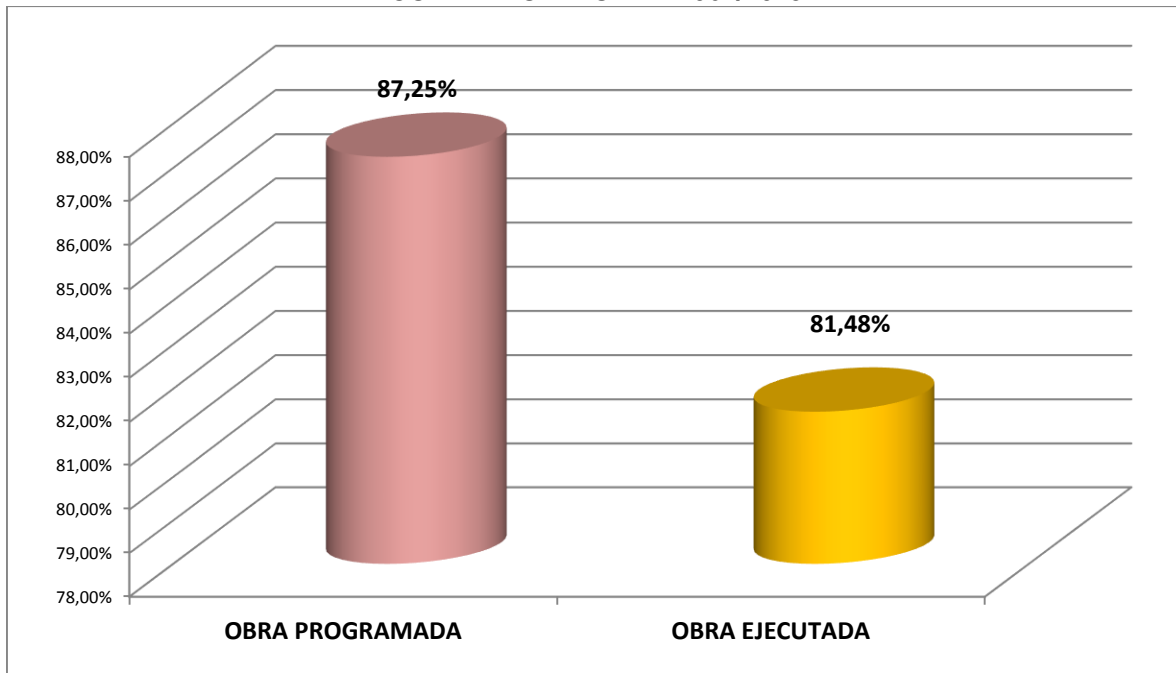

En la gráfica, se observa un leve atraso en el avance físico de la obra la cual está programada para su entrega total el 19 de diciembre de 2014.

Al respecto, es importante señalar las inconsistencias que ha evidenciado la interventoría y que han generado atraso en las obras de la institución educativa:

“(...) En los últimos meses, ha habido un atraso permanente, la Interventoría ha enviado varios oficios al respecto, además de ser este uno de los temas tocados en todos los Comités de Obra realizados semanalmente, con presencia del personal de Obra e Interventoría, incluyendo coordinadores de proyectos y representantes legales de cada una de estas, además de la Supervisión de la SED.

Entre los oficios más importantes que la Interventoría ha enviado se encuentran los siguientes:

- *JUU-2384-179, PRIMER AVISO (24 de septiembre de 2014), donde la Interventoría solicita aumento de personal inmediato, retomar las actividades de obras exteriores como el cerramiento, y un plan de acción para atender y subsanar los detalles de obra que han sido señalados.*
- *JUU-2384-184, SEGUNDO AVISO (1 de octubre de 2014), nuevamente la Interventoría hace un llamado de atención por incumplimiento con algunos requerimientos del oficio anterior y además se solicita una programación detallada de las actividades contractuales.*

El contratista hace entrega de la programación sugerida por la Interventoría.

- *JUU-2384-196, TERCER AVISO (14 de octubre de 2014), pese a que el contratista cumplió parcialmente con los requerimientos realizados en los anteriores oficios, se hace un tercer aviso ya que se encuentran otras observaciones donde se solicita al contratista:*

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

- Estudios de fotometría y del proyecto serie 3 para estudio y aprobación por la Interventoría, se debía presentar información sobre esto el día 20 de octubre de 2014.
- Se evidencia que la actividad en la cubierta no ha iniciado y en la programación radicada definen que será entregada el 30 de octubre, una actividad que presenta atraso.
- Certificados de curso de alturas de personal administrativo como operativo.

El contratista da respuesta con el oficio MYH-VENECIA-079-14 (13 noviembre de 2014), donde manifiesta que se han subsanado algunas observaciones hechas por la Interventoría, se entrega una programación por espacio con las novedades que se debían atender en cada uno y las fechas de entrega para su control, justifica el atraso de las casetas de celaduría y enfermería ya que dependía de la entrega de este espacio por parte del colegio, la fecha de entrega fue el 15 de noviembre cuando se terminó el calendario escolar , en cuanto a los tramites ante CODENSA explica que estos son dispendiosos y demorados. (...)

En visita realizada el 10/12/2014 a la Institución Educativa Distrital “VENECIA” por el equipo auditor, se obtuvo el siguiente registro fotográfico del estado actual de la obra:

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA A OBRA	10 DE DICIEMBRE DE 2014
COLEGIO DISTRITAL VENECIA	CONTRATO DE OBRA Nº 002064/2013
ENTIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL- SED	DIRECCIÓN: CARRERA 55 Nº 49-25 SUR
	
Vista costado nororiental del bloque 8. La rampa originalmente solo llegaba al segundo nivel de la edificación.	Se ejecutan acabados de piso salón de danzas.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA A OBRA	10 DE DICIEMBRE DE 2014
COLEGIO DISTRITAL VENECIA	CONTRATO DE OBRA Nº 002064/2013
ENTIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL- SED	DIRECCIÓN: CARRERA 55 Nº 49-25 SUR
	
Tercer nivel del Bloque 8 construido sin atender los diseños originales aprobados en la licencia de construcción revalidada.	
	
Obra en ejecución correspondiente a la cocina	Obras exteriores en ejecución
	

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA A OBRA	10 DE DICIEMBRE DE 2014
COLEGIO DISTRITAL VENECIA	CONTRATO DE OBRA Nº 002064/2013
ENTIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL- SED	DIRECCIÓN: CARRERA 55 Nº 49-25 SUR
Área de bloque demolido recientemente y en el cual se realizan trabajos de compactación de material de relleno para adecuarlo posteriormente como espacio del patio de recreo.	Rampa que asciende a tercer nivel, no incluida en el proyecto aprobado en la licencia de construcción.
	
Se construyó cerramiento y se adecuan obras en las circulación exterior costado norte del bloque 8	Dotación almacenada, entregada a la institución educativa, que se será distribuida una vez se terminen las obras del bloque 8.

1.3.1.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto se modificó la obra del bloque 8 del colegio distrital “VENECIA” que había sido aprobada en la licencia de construcción revalidada.

Las obras de terminación del bloque 8 de aulas del Colegio Distrital Venecia y cuentan con un avance aproximado del 85% de ejecución y con licencia de construcción revalidada aprobada con resolución Nº RES14-2-0802 del 9 de julio de 2014, la cual concede prórroga por 12 meses por una sola vez al término de vigencia de la licencia de construcción contenida en la Resolución No RES 08-02-0566 del 27 de octubre de 2008 aprobada originalmente, la cual había sido prorrogada mediante resolución Nº 11-2-0427 del 27 de mayo de 2011 y revalidada mediante resolución Nº Res-12-2-250 del 29 de junio de 2012, por la Curaduría Urbana Nº 2 y en la cual se ratifica en su artículo 2, que se deben mantener las condiciones originales con que fue aprobado el proyecto en la Resolución Nº Res. 08-2-0566 de 2008.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Posteriormente, se concede prórroga a la revalidación a la licencia de construcción, con resolución N° RES 14-2-08-02 del 9 de julio de 2014 por un término de 12 meses.

De acuerdo con la información suministrada en la obra, se pudo evidenciar que la conformación del Bloque 8 en su tercer nivel se componía inicialmente de 2 aulas, un laboratorio de ciencias y un aula de informática (ver gráfico 1).

Posteriormente, durante la ejecución de la obra, el diseño es modificado y ejecutado cambiando la conformación inicial y se amplía el área de construcción siendo ejecutados, los siguientes espacios: 5 aulas de clase, un laboratorio de informática, un laboratorio de ciencias, dos baños y un aula de danzas (ver gráfico No. 2).

Con esta actuación la SED y contratista de obra, modifican de manera irregular lo aprobado en la licencia de construcción del colegio

Con lo referido se evidencia el incumplimiento de lo establecido en el decreto 1469 de 2010, en su artículo 49, el cual señala:

“Artículo 49. Tránsito de normas urbanísticas y revalidación de licencias. Cuando una licencia pierda su vigencia por vencimiento del plazo o de la prórroga, el interesado deberá solicitar una nueva licencia, ante la misma autoridad que la expidió, ajustándose a las normas urbanísticas vigentes al momento de la nueva solicitud”.

Sin embargo, el interesado podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación de la licencia vencida, entendida esta como el acto administrativo mediante el cual el curador urbano o la autoridad encargada de la expedición de licencias urbanísticas, concede una nueva licencia, con el fin de que se culminen las obras y actuaciones aprobadas en la licencia vencida, siempre y cuando el proyecto mantenga las condiciones originales con que fue aprobado inicialmente, que no haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar y que el constructor o el urbanizador manifieste bajo la gravedad del juramento que el inmueble se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones: (...)” Subrayado y negrilla fuera de texto.

De otra parte, se incumple lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Teniendo en cuenta lo referido anteriormente, se establece una **presunta observación administrativa con incidencia disciplinaria**, por el incumplimiento a lo aprobado en la licencia de construcción revalidada y modificando los diseños y posteriormente la construcción realizada no correspondiendo con la licencia original.

Análisis Respuesta

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

La entidad en su respuesta alude el cambio de diseño en forma posterior a la aprobación de la prórroga de la revalidación de la licencia de construcción por parte de la respectiva curaduría urbana, argumentando que este hecho se motivó por cuanto la entidad advierte tardíamente que los diseños entregados originalmente para el nivel 3 del bloque 8, no atendían entre otros aspectos a las limitantes presentadas para personas en estado de discapacidad.

Dicha argumentación no es aceptable, toda vez que los diseños contratados y recibidos a satisfacción por la SED, debían atender este tipo de requerimientos de acuerdo con la normatividad vigente y no efectuarse de forma posterior a la aprobación de la revalidación de la licencia de construcción.

Por lo tanto, no es dable que la entidad infrinja una norma claramente establecida con el fin de atender un requerimiento que debió tenerse en cuenta al recibo a satisfacción de los estudios contratados y pagados en desarrollo del proyecto de reforzamiento y/o restitución del bloque 8 del Colegio Distrital “*Venecia*”, es decir, se podía afirmar que el fin no justifica los medios.

Por lo expuesto anteriormente, la respuesta entregada por la SED no se acepta y se confirma el **hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria**.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

GRAFICO 3
PLANTA ORIGINAL DEL TERCER NIVEL BLOQUE 8 COLEGIO DISTRITAL VENECIA



Fuente: interventoría de obra Consultorías Obras Civiles - Contrato N° 2384/13

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Dotación de Colegios

La meta del Programa es tener 20 colegios construidos y dotados, dicha dotación se efectuó en las aulas que fueron entregadas. Hasta la fecha, de los veinte (20) colegios, se han entregado y dotado completamente diecisiete (17) y se han intervenido diecinueve (19), los cuales se dotaron en la medida de la disponibilidad de espacios.

La construcción de la infraestructura educativa así como la dotación se llevó a cabo desde el año 2006 al 2013, mediante la suscripción y ejecución de 39 contratos por valor de \$86.899.844 mil pesos con cargo al crédito del BID. Por su parte, la SED ejecuto recursos para el mismo propósito como contrapartida por valor de \$78.976.399 mil pesos, para un total de \$165.876.244 mil pesos, en la construcción y dotación de colegios. (VER ANEXO 1)

1.3.2. Componente 2. Aumento de la retención y la graduación

Dentro de la ejecución del Crédito BID 1812-OC-CO, el Componente 2 está compuesto por dos subcomponentes: Subsidios condicionados a la Asistencia Escolar para Educación Básica y Subsidios para Educación Superior, Técnica o Tecnológica. La apropiación de recursos para este componente fue la siguiente:

**CUADRO 6
ASIGNACION RECURSOS
AUMENTO DE LA RETENCION Y LA GRADUACION**

Cifras en miles de Pesos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN COMPONENTE	COMPROMISOS (RP) A 22-06-14	
			BID	LOCAL
II	2.1	Subsidios Condicionados Educación Básica	21.140.534	11.407.812
	2.2	Subsidios Condicionados Educación Superior	6.969.158	4.506.918
TOTAL AUMENTO DE LA RETENCIÓN Y LA GRADUACIÓN			28.109.692	15.914.731

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014

Este componente tuvo una participación del 22,11% del total del crédito con el BID. Para ejecutar los dos subcomponentes contó con un total de recursos de \$44.024.423 mil pesos, los cuales fueron comprometidos mediante la celebración de 191 contratos ejecutados durante las vigencias 2006 a 2014.

1.3.2.1. Subcomponente 2.1 Subsidios Condicionados Educación Básica

Dentro de este subcomponente se asignaron recursos para dos actividades básicas: una es el mantenimiento de la estructura técnica y administrativa que soporta el

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

diseño y la operacionalización del programa y la otra es la entrega de los subsidios propiamente dichos. La apropiación de recursos fue la siguiente:

**CUADRO 7
APROPIACION DE RECURSOS
SUBSIDIOS CONDICIONADOS EDUCACIÓN BÁSICA**

Cifras en miles de pesos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN COMPONENTE	COMPROMISOS (RP) A 22-06-14	
			BID	LOCAL
II	2.1	Subsidios Condicionados Educación Básica	21.140.534	11.407.812

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014

Este subcomponente contó con un total de \$32.548.346 mil pesos, los cuales fueron ejecutados en el 100%, durante las vigencias 2008 a 2010.

1.3.2.2. Subcomponente 2.2 Subsidios Condicionados Educación Superior, Técnica y Tecnológica

Esta modalidad cuenta con dos tipos de subsidio, acceso y permanencia que cubre el 100% de los costos de matrícula y dos SMMLV de sostenimiento semestral dirigido a estudiantes nuevos y subsidio de permanencia que equivale solo al sostenimiento de los gastos asociados al proceso educativo como materiales, libros, transporte y alimentación entre otros, dirigido específicamente a jóvenes que ya están adelantando una carrera técnica o tecnológica. La apropiación de recursos fue la siguiente:

**CUADRO 8
APROPIACION DE RECURSOS SUBSIDIOS CONDICIONADOS
EDUCACIÓN SUPERIOR, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

Cifras en miles de pesos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN COMPONENTE	COMPROMISOS (RP) A 22-06-14	
			BID	LOCAL
II	2.2	Subsidios Condicionados Educación Superior	6.969.158	4.506.918

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014

Este subcomponente contó con un total de \$11.476.076 mil pesos, los cuales fueron ejecutados en el 100%, durante las vigencias 2008 a 2010.

La aplicación de estos subsidios inició con un plan piloto en el primer semestre de 2006 mediante un convenio suscrito con FODESEP, entidad que agrupa Instituciones de Educación Superior en una alianza estratégica que optimiza los recursos y la operación del proyecto, y se extenderá hasta el momento en que los jóvenes participantes en ella culminen sus estudios de Educación Superior.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

1.3.3. Componente 3. Mejoría de la calidad

El objetivo cumplido de este componente ha sido el mejoramiento en los niveles de aprendizaje de los alumnos ubicados en los colegios que atienden a poblaciones más vulnerables, en particular para los nuevos colegios.

**CUADRO 9
APROPIACIÓN RECURSOS MEJORIA DE LA CALIDAD**

Cifras en miles de pesos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN COMPONENTE	COMPROMISOS (RP) A 22-06-14	
			BID	LOCAL
III	3.1	Recursos para el aprendizaje	7.590.180	
	3.2	Desarrollo Profesional docente y directivo	0,00	2.811.711
	3.3	Evaluación de los aprendizajes	0,00	997.688
TOTAL MEJORÍA DE CALIDAD			7.590.180	3.809.399

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014

Este componente tuvo una participación del 0.89% del total del crédito con el BID, los cuales fueron asignados al subcomponente 3.1 recursos para el aprendizaje, toda vez que los subcomponentes restantes les fue asignados recursos por concepto de contrapartida. Para ejecutar los tres subcomponentes se contó con un total de recursos de \$11.399.579 mil pesos, los cuales fueron comprometidos mediante la celebración de 104 contratos durante las vigencias 2006 a 2012, cuya ejecución se encuentra en el 100%.

De los recursos del crédito se tienen compromisos por pagar al 22 de junio de 2014 la suma de \$32.959 pesos al BID.

1.3.3.1. *Subcomponente 3.1 Recursos para el Aprendizaje Adecuados y Utilizados*

En este subcomponente, la SED ha ejecutado la puesta en uso de una (1) biblioteca en cada uno de los 20 colegios del programa y de igual manera, se dotó y se puso en uso un aula de tecnología, matemáticas, física, biología y química, en cada uno de los colegios del programa. Le fueron asignados recursos por \$7.590.180 mil pesos del crédito BID, recursos que fueron ejecutados en el 100%.

1.3.3.2. *Subcomponente 3.2 Programa de Desarrollo Profesional Docente y Directivo*

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

El objetivo de este subcomponente fue la capacitación de 800 personas (directivos docentes, docentes y bibliotecarios) en estrategias de fomento a la lectura, organización, uso y manejo de las bibliotecas escolares. Conto con una asignación presupuestal de \$ 2.811.711 mil pesos provenientes de recursos de la SED, no hubo recursos del crédito externo; su ejecución fue del 100%.

2. 3.3.3. Subcomponente 3.3 Evaluación de Aprendizajes como Insumo para la Práctica Docente

La Secretaría de Educación del Distrito ha desarrollado procesos de evaluación que enfocan su mirada en los estudiantes, los maestros y maestras y las instituciones educativas del sector oficial. Estos procesos de evaluación han sido de carácter interno y externo y a su vez han permitido a la entidad contar con instrumentos de evaluación en diferentes formatos (papel, aplicativos virtuales), así como, construir una cultura de la evaluación con y para las comunidades educativas del Distrito Capital, mediante la orientación y acompañamiento de equipos de alto nivel investigativo, que poco a poco va instalándose como parte integral de la vida educativa de los diferentes actores de la educación pública. Para el cumplimiento de este objetivo, la SED asigno recursos por \$997.688 mil pesos, sin la participación de recursos del crédito externo. Reporta una ejecución del 100%.

1.3.4. Gastos operativos

La asignación de recursos para atender los gastos operativos que demando el programa “Equidad en Educación en Bogotá” mediante la ejecución de recursos del crédito externo con el BID y contrapartida de la SED fue el siguiente:

**CUADRO 10
APROPIACIÓN RECURSOS GASTOS OPERATIVOS**

Cifras en miles de pesos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN COMPONENTE	COMPROMISOS (RP) A 22-06-14	
			BID	LOCAL
IV	4.1	Administración	0.0	557.877
	4.2	Auditoría	209.200.	0,00
	4.3	Evaluación	609.033	0,00
Total IV GASTOS OPERATIVOS			818.233	557.877
V. IMPREVISTOS			0,00	0,00
TOTAL			1.636.466	557.877

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014

El total de gastos operativos que demando la ejecución del programa “Equidad en Educación en Bogotá” fue de \$1.373.110 mil pesos, de los cuales \$818.233 mil pesos fueron del crédito con el BID, quedando a junio 22 de 2014 un valor por pagar de \$20 millones.

Contratación Auditoría Externa

Contractualmente, la firma Grant Thornton Ulloa Garzón & Asociados, ha sido desde el corte de diciembre 31 de 2007, previa no objeción del BID, la firma que ha realizado las auditoría externas de los cierres de ejercicios económicos anuales, requeridas por el BID para obtener opinión profesional de auditores independientes con respecto a la información financiera y operacional del proyecto, la evaluación del sistema de control interno y la utilización de los recursos del proyecto de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de préstamo.

Durante el año 2013 se adelantó este proceso para el corte de diciembre 31 de 2012, y en los términos previstos la SED envió al BID el informe con el respectivo dictamen, dando cumplimiento así a la Cláusula 5.05 del Contrato de Préstamo y al artículo 7.03 de las Normas Generales. De los años anteriores y de esta vigencia, se ha obtenido la no objeción del BID, dando por cumplido el compromiso.

Para la vigencia 2014 con recursos propios fue contratada la auditoría por seis meses, dado que el contrato de empréstito fue prorrogado hasta el 22 de junio de 2014.

1.3.5. Seguimiento financiero

De acuerdo con las necesidades específicas requeridas para el contrato de préstamo BID 1812/OC-CO, la presentación de los estados contables se ciñe a la clasificación y la estructura definida en este plan de cuentas conformado por cinco niveles de clasificación denominados Clase, Grupo, Cuenta, Subcuenta y Auxiliares con ocho dígitos que conforman el código contable.

Los estados financieros del programa fueron preparados con base en las instrucciones y prácticas contables establecidas por el Banco en el documento OP-273-2. La información base para los registros contables está reconocida en los libros de la Secretaria de Hacienda Distrital, que para el efecto sigue instrucciones y prácticas contables de la Contaduría General de la Nación, los cuales se consideran principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para entidades del Sector Público.

El presupuesto inicial del proyecto fue por noventa millones de dólares (US\$90.000.000), de los cuales sesenta millones de dólares (US\$60.000.000) son del crédito BID y treinta millones de dólares (US\$30.000.000) por aporte local o

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

contrapartida de la SED. El valor del compromiso inicial de la SED (30 millones de dólares) por contrapartida ha sido superado ampliamente, porque se han invertido con corte 22 de Junio de 2014 US\$45.787.676.

De los compromisos adquiridos, reflejados en los registros presupuestales emitidos, se han pagado y reportado a Secretaría de Hacienda Distrital mediante 25 solicitudes de desembolso por valor de US\$59.169,661 del crédito BID y US\$45.787.676 de Contrapartida (SED).

Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados.

Compuesto por los recursos recibidos del Banco y por el aporte local y los desembolsos efectuados a cada uno de las erogaciones realizadas. La elaboración de este estado se basa en el sistema de caja y presenta el detalle de los aportes recibidos por los diferentes conceptos o fuentes de financiación Crédito y Contrapartida, durante la ejecución del programa, el proyecto recibió ingresos provenientes del crédito BID 1812/OC-CO y contrapartida del presupuesto distrital.

Muestra las fuentes de efectivo generado por las operaciones y su utilización en la operación, inversión o financiación de las actividades durante el período cubierto, este estado es importante porque centra la atención en dos puntos: a) qué hizo la entidad ejecutora con los recursos y b) de dónde provinieron los fondos.

1.3.5.1. Hallazgo administrativo por la periodicidad en la ejecución de los recursos externos

Para este ente de control llama la atención el hecho de que hayan transcurrido ocho (8) años desde la fecha de la firma de los contratos de préstamo de crédito externo, y aun se encuentren en proceso solicitudes de reembolso.

Tal situación obedeció a que desde la firma de los contratos (vigencia 2006), su ejecución se llevó a cabo mediante procesos contractuales que revisten situaciones que fueron observadas por este ente de control, generando atrasos en la ejecución de los respectivos proyectos.

Lo anterior puede generar posibles sobrecostos en el pago de intereses que se causen sobre los mismos, contraviniendo los principios de la Ley 87 de 1993.

Por los hechos antes mencionados se constituye una observación administrativa.

Análisis Respuesta

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Analizada la respuesta se observa que la Administración reconoce que hubo dificultades jurídicas en la ejecución de los contratos de obra relacionados con la construcción de la Infraestructura Educativa, que inclusive llevó a que se prorrogara por dos años más el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, a fin de cumplir con las metas previstas, amén que al cierre del crédito (22 de junio de 2012) estaba pendiente la terminación de obras de 3 colegios.

En este sentido, es evidente la falta de planeación en la ejecución del programa “Equidad de Educación en Bogotá” con recursos del crédito externo.

Por los hechos antes señalados y a fin que la Administración adopte los correctivos pertinentes hacia futuros proyectos con recursos de crédito externo, se ratifica el hallazgo administrativo.

Desembolsos recursos - crédito externo - BID.

El presupuesto inicial del proyecto fue por noventa millones de dólares, de los cuales sesenta millones de dólares son del crédito BID y treinta millones de dólares por aporte local o contrapartida de la SED.

**CUADRO 11
DESEMBOLSOS RECURSOS EXTERNOS**

COMPONENTES	PRESUPUESTO	SALDO ACUMULADO A 31-12/2013	MOVIMIENTO 2014	SALDO 22-06/2014	%
1. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
1.1. Construcción y Dotación de colegios	41.796.820	40.449.290	539.968	40.989.258	96,78
2. AUMENTO DE LA RETENCION Y LA GRADUACION					
2.1. Subsidios condicionados educación básica	10.343.930	10.343.930	0	10.343.930	100
2.2. Subsidios condicionados educación superior	3.649.686	3.649.688	0	3.649.688	100
3. MEJORIA DE LA CALIDAD					
3.1. Recursos para el aprendizaje	3.758.188	3.758.188	0	3.758.188	100
3.2. Desarrollo profesional docente y directivo	0	0	0	0	
3.3. Evaluación de los aprendizajes	0	0	0	0	
4. GASTOS OPERATIVOS					
4.1. Administración	0	0	0	0	
4.2. Auditoria	113.024	100.856	0	100.856	89,23
4.3. Evaluación	338.352	327.742	0	327.742	96,86
TOTALES	60.000.000	58.629.694	539.968	59.169.662	98,62

Fuente: Informe Financiero- SED

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

El préstamo del BID reportó una ejecución presupuestal del 98,62%, equivalente a US\$830.338 dólares que no fueron comprometidos; lo anterior en razón a la ejecución de los componentes: Construcción Infraestructura Educativa con un 96,78%, seguido del componente gastos operativos con un 89,23%. El siguiente cuadro muestra la ejecución de recursos de la contrapartida (SED):

**CUADRO 12
RECURSOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN - PROYECTOS CREDITO EXTERNO (US\$)**

COMPONENTES	PRESUPUESTO	SALDO ACUMULADO A 31-12/2013	MOVIMIENTO 2014	SALDO 22-06/2014
1. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
1.1. Construcción y Dotación de colegios	20.098.000	37.926.298	0	37.926.298
2. AUMENTO DE LA RETENCION Y LA GRADUACION				
2.1. Subsidios condicionados educación básica	5.086.000	5.097.197	0	5.097.197
2.2. Subsidios condicionados educación superior	2.076.000	603.630	0	603.630
3. MEJORIA DE LA CALIDAD				
3.1. Recursos para el aprendizaje	0	0	0	0
3.2. Desarrollo profesional docente y directivo	1.378.000	1.383.419	0	1.383.419
3.3. Evaluación de los aprendizajes	502.000	489.731	0	489.731
4. GASTOS OPERATIVOS				
4.1. Administración	721.000	287.401	0	287.401
4.2. Auditoría	0	0	0	0
4.3. Evaluación	0	0	0	0
5. IMPREVISTOS	139.000	0	0	0
TOTALES	30.000.000	45.787.676	0	45.787.676

Fuente: Informe Financiero- SED

El presupuesto inicialmente aprobado tuvo un incremento del 34%, en razón a la contrapartida del proyecto Construcción y Dotación de colegios con una asignación de US\$37.926.298 dólares, frente a lo presupuestado de US\$20.098.000

El valor del compromiso inicial de la SED (30 millones de dólares) por contrapartida ha sido superado ampliamente, porque se han invertido con corte 22 de Junio de 2014 US\$45.787.676.

La ejecución financiera de los proyectos de inversión fue el siguiente:

**CUADRO 13
EJECUCIÓN FINANCIERA - PROYECTOS DE INVERSIÓN - CREDITO EXTERNO - BID.**
(cifras en US\$)

# SOLICITUDES DESEMBOLSOS SH	FECHA	1	2	3	FECHA DE LEGALIZACIÓN
		VALOR US\$	BID	LOCAL	
1	oct-07	45.697.643,36	25.179.261,86	20.518.381,50	2007
2	abr-08	27.515.162,49	17.761.311,32	9.753.851,17	oct-11

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

3	jul-08	12.358.368,42	6.323.726,50	6.014.641,92	oct-11
	Solicitud Inicial	23.293.232,21			
	Valor Aprobado	23.202.862,10			
4	may-09	11.677.426,95	4.670.551,02	7.006.875,93	Sin legalizar ante el BID
5	jul-09	864.064,51	289.959,75	574.104,76	No Registra
6	ago-09	2.085.174,26	1.503.686,41	581.487,85	No Registra
7	feb-10	934.576,60	414.747,75	519.828,85	No Registra
8	may-10	164.346,26	122.084,73	42.261,53	No Registra
9	ago-10	593.306,23	412.590,75	180.715,48	No Registra
10	nov-10	230.293,27	139.183,96	91.109,31	No Registra
11	ene-11	314.214,76	180.617,40	133.513,12	No Registra
12	may-11	243.534,37	186.202,04	57.332,33	No Registra
13	ago-11	603.465,45	534.906,70	68.558,75	No Registra
14	01/09/2011 ajuste (-) *	791.805,61			No Registra
15	nov-11	424.685,83	405.925,28	18.760,65	No Registra
16	ene-12	323.453,91	313.110,63	10.343,28	Sin legalizar ante el BID
17	may-12	190.767,69	181.203,90	9.563,79	Sin legalizar ante el BID
18	jul-12	318.474,92	310.531,26	7.943,66	Sin legalizar ante el BID
19	oct-12	335.799,14	137.397,16	198.401,98	No Registra
20	ene-13	791.805,61	791.805,61	0,00	No Registra
21	jul-13	718.376,04	718.376,04	0,00	No Registra
22	jul-13	192.177,43	192.177,43	0,00	No Registra
23	abr-14	202.239,67	202.239,67	0,00	No Registra
24	may-14	337.728,39	337.728,39	0,00	No Registra
TOTAL		131.111.753,27	61.309.325,56	45.787.675,86	107.097.001,42

Fuente: Informe financiero - SED

De los compromisos adquiridos, reflejados en los registros presupuestales emitidos, se han pagado y reportado a Secretaría de Hacienda Distrital mediante 24 solicitudes de desembolso por valor de US\$131.111.753 Dólares, no obstante, los resultados del cuadro anterior muestran en la columna 2 un total de US \$61.309.325, 56 dólares, desembolsados por el BID en calidad de préstamo, mientras que el nivel local (columna 2) participo con una inversión de US \$45.787.675,86, para un gran total (columna 3) de US\$ 107.097.001,42 Dólares. Comparado este valor con el reportado en el cuadro de desembolsos recursos - crédito externo - BID se presenta una diferencia de US\$ 2.139.664,56 Dólares.

Durante la vigencia de 2014 se enviaron a Secretaría de Hacienda Distrital la justificación de gastos No. 23, 24 y 25 de recursos de contrapartida, así:

CUADRO 14

EJECUCIÓN DE GASTOS 2014 - RECURSOS CREDITO EXTERNO - BID

No. SOLICITUD	EN PESOS \$		EN DOLARES US\$	
	BID	CONTRAPARTIDA	BID	CONTRAPARTIDA
23	202.239,67	0,00	202.239,67	0,00
24	397.004.234,00	0,00	202.240,00	0,00
25	645.729.051,00	0,00	337.728,00	0,00
TOTAL	1.042.935.524,67	0,00	742.207,67	0,00

Fuente: Informe financiero - SED

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

1.3.5.2. Adquisición de bienes y servicios 2014

Durante la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 22 de junio 2014 la SED no suscribió contratos con recursos del programa por encontrarse en la etapa final del crédito con el BID.

El siguiente cuadro muestra el estado de la inversión por componente:

CUADRO 15
ESTADO DE LA INVERSIÓN PROYECTOS CREDITO BID 2006 - 2014

en miles de pesos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN COMPONENTE	TOTAL BID	TOTAL CONT	TOTAL
I	Total 1.1	Construcción y Dotación Colegios	86.781.924,00	78.976.398,00	165.758.322,00
	TOTAL I		86.781.924,00	78.976.398,00	165.758.322,00
II	Total 2.1	Total Subsidios Condicionados Educación Básica	21.140.534,00	11.388.535,00	32.529.069,00
	Total 2.2	Subsidios Condicionados Educación Superior	6.969.158,00	4.506.918,00	11.476.076,00
	TOTAL II		28.109.692,00	15.895.453,00	44.005.145,00
III	Total 3.1	Total Recursos para el aprendizaje	7.589.877,00	0,00	7.589.877,00
	Total 3.2	Total Desarrollo Profesional docente y directivo	0,00	2.811.711,00	2.811.711,00
	Total 3.3	Total Evaluación de los aprendizajes	0,00	997.688,00	997.688,00
	TOTAL III		7.589.877,00	3.809.399,00	11.399.276,00
IV	Total 4.1	Total Administración	0,00	557.876,00	557.876,00
	Total 4.2	Total Auditoría	189.199,00	0,00	189.199,00
	Total 4.3	Total Evaluación	609.033,00	0,00	609.033,00
	TOTAL IV		798.232,00	557.876,00	1.356.108,00
TOTAL GENERAL			123.279.725,00	99.239.126,00	222.518.851,00

Fuente: Informe financiero - SED

El total de la Inversión con recursos del crédito del BID 2006 a 2014 fue de \$123.279.725 mil pesos que frente al valor total del préstamo (\$127.110.723.176,43 pesos), arroja un valor por pagar la BID de \$ 3.830.998 mil pesos.

1.4. EJECUCION PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS 2012 -2014 BIRF

En el año 2006 se celebró el contrato de préstamo BIRF 7365-CO con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por US\$29.000.000 de dólares.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Bajo el proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad del Distrito ante Desastres Naturales”, la Secretaría de Educación del Distrito Capital avanzó significativamente en los procesos de selección y ejecución de las obras objeto del crédito, en lo concerniente al componente B.1.1 Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales.

1.4.1. Estructura del programa

El Programa ha financiado las siguientes categorías de inversión con dos fuentes, con recurso externo y de contrapartida, la ejecución de los recursos del Crédito y del Aporte Local se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO 16
EJECUCION RECURSOS BIRF**

En miles de pesos

COMPONENTE	VALOR	EDIFICACIONES - COMPONENTE (B) OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO CUENTA 164009	GASTOS SOCIALES – COMPONENTE (D) PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN DEL RIESGO CUENTA 550105
B.1.1	\$75,535,917	\$75,535,917	-
Aporte Local Componente D.1.2	\$173,003	-	\$173,003
Total	\$75,708,920	\$75,535,917	\$173,003

Fuente: Informe financiero - SED

Como se observa en el cuadro anterior el mayor aporte de recursos del nivel externo fue para el componente B1.1 mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales con un 99.7%.

1.4.1.1. COMPONENTE B

1.4.1.1.1. Obras de Mitigación del Riesgo

Las “Obras de mitigación del riesgo” por su parte, buscan acotar el nivel de pérdidas materiales y humanas esperadas y el impacto asociado a tales pérdidas a niveles socialmente aceptables. Se busca incrementar las acciones para la reducción de los riesgos existentes (intervención correctiva del riesgo o mitigación) mediante la intervención física de la amenaza y/o vulnerabilidad, a través de reforzamiento estructural de edificaciones y obras de estabilización y recuperación.

B1 MITIGACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN

B.1.1 Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales.

El siguiente cuadro muestra las instituciones educativas donde se ejecutaron los recursos vía crédito externo BIRF:

**CUADRO 17
RECURSOS BIRF POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**

En miles de pesos

BIRF 7365 CO						
AÑO	PROY	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS DEL PROYECTO	COMPONENTE	NOMBRE DE LA META (S) INVOLUCRADAS	RECURSOS INVERTIDOS POR META
2006	312	Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales	Crédito: \$19.474.657.311.17 Contrapartida: \$9.475.695.532	Mejoramiento y reforzamiento	42 I.E.D. reforzadas	Crédito: \$9.082.594.000 Contrapartida: \$6.966.497.000
2007	312	Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales	Crédito: \$39.219.317.525 Contrapartida: \$9.475.695.522	Mejoramiento y reforzamiento	42 I.E.D. reforzadas	Crédito: \$35.470.423.000 Contrapartida: \$9.475.696.000
2008	312	Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales	Crédito: \$39.219.317.525 Contrapartida: \$9.475.695.522	Mejoramiento y reforzamiento	42 I.E.D. reforzadas	Crédito: \$12.653.154.012
2008	563	Construcción y conservación de la infraestructura del sector educativo oficial	Crédito: \$3.467.566.140	Construcción Plantas Físicas	42 I.E.D. reforzadas	
2008	557	Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá	Contrapartida: \$90.503.200	Salud al colegio	Beneficiar a 50.000 estudiantes	Contrapartida: \$90.503.200
2010	557	Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá	Contrapartida: \$82.500.000	Salud al colegio	Beneficiar a 550 estudiantes	Contrapartida: \$82.500.000
2010	563	Construcción y conservación de la infraestructura del sector educativo oficial	Crédito: \$8.021.938.435 Contrapartida: \$825.224.404	Construcción Plantas Físicas	2 I.E.D reforzadas	-
2011	563	Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá	Contrapartida: \$96.205.673	Consultorías	1 consultoría	-
			Contrapartida: \$825.224.404 Crédito: \$5.786.872.429	Construcción Plantas Físicas	1 I.E.D reforzadas	Contrapartida: \$330.426.068 Crédito: \$5.064.194.439

Fuente: Oficina de Planeación SED

Considerando los estándares básicos de construcciones escolares establecidos por la SED, se implementó un proyecto de atención a la planta física que atiende en

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

forma integral las necesidades de infraestructura de las plantas físicas de las IED (reforzamiento estructural), lo que contribuye a reducir el riesgo, disminuir el impacto de desastres y emergencias y cumplir con los estándares básicos en las construcciones escolares.

El siguiente cuadro muestra las instituciones educativas donde se ejecutaron los recursos del crédito externo BIRF.

CUADRO 18
EDIFICACIONES -COMPONENTE (B) OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO

Cifras en pesos

No. Contrato	INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES	REGISTRO PRESUP	TOTAL GENERAL	
			BIRF	CONTRAPARTIDA
1	1400/10 CED DARIO ECHANDIA Sede A	1 RP	\$ 2.235.066.006,00	
2	142/06 I.E.D. CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE A	1 RP		\$ 2.616.351.675,00
3	143/06 I.E.D. PABLO DE TARSO	1 RP		\$ 941.105.808,87
4	151/06 SAN CRISTOBAL Sede B JOSE A MORALES	1 RP		\$ 734.749.390,00
5	163/06 EL CORTIJO - VIANEY	1 RP		\$ 1.027.850.889,00
6	170/06 I.E.D. LA MERCED SUR	1 RP		\$ 179.636.614,99
7	1722/10 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1 RP		\$ 179.800.000,00
8	178/07 CED DARIO ECHANDIA Sede A	1 RP	\$ 2.251.394.876,55	
9	179/07 CED GUSTAVO MORALES Sede A	1 RP	\$ 3.626.853.584,00	
10	180/07 CED SAN FRANCISCO Sede B - La Casona	1 RP	\$ 903.231.273,00	
11	181/07 CED NIDIA QUINTERO DE TURBAY Sede B	1 RP	\$ 1.443.467.426,00	
12	182/06 I.E.D. DAMASO ZAPATA	1 RP		\$ 868.294.204,00
13	182/07 CED ALEMANIA UNIFICADA SEDE SAN MARTIN DE LOBA	1 RP	\$ 873.091.998,00	
14	183/07 CED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS Sede B - GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	1 RP	\$ 1.285.988.095,80	
15	184/07 CED EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES Sede B - TOMAS JEFFERSON	1 RP	\$ 162.071.557,00	
16	185/06 I.E.D. JORGE GAITAN CORTES SEDE A	1 RP		\$ 534.707.884,89
17	185/07 CED ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO Sede B- PRADO PINZON	1 RP	\$ 780.226.750,80	
18	186/06 I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ Sede B MERCEDES FERNANDEZ	1 RP		\$ 644.184.585,71
19	186/07 CED LUIS LOPEZ DE MESA Sede A	1 RP	\$ 2.158.123.700,00	
20	187/06 I.E.D. CLEMENCIA DE CAICEDO	1 RP		\$ 766.698.063,64
21	1895/11 SAN JOSE DE CASTILLA	1 RP	\$ 5.697.273.113,00	\$ 825.224.404,00
22	191/06 I.E.D. UNION COLOMBIANA Sede A	1 RP		\$ 1.813.552.895,33
23	192/06 I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE Sede B - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1 RP		\$ 1.589.730.141,85
24	194/06 I.E.D. : NUEVA ESPERANZA Sede A	1 RP		\$ 1.642.205.971,00
25	197/06 I.E.D. : LUIS LOPEZ DE MESA -JOSE MARTI Sede C - GRANJAS DE SAN PABLO	1 RP		\$ 1.366.349.121,14
26	204/06 I.E.D.: REPUBLICA DE PANAMA Sede B AVENIDA CHILE	1 RP		\$ 151.908.992,00
27	231/06 I.E.D. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, Sede B (AGOBERTO MEJIA CIFUENTES)	1 RP		\$ 837.798.327,42
28	241/07 GLORIA GAITAN	1 RP	\$ 1.876.673.051,00	
29	242/07 GABRIELA MISTRAL	1 RP	\$ 1.816.054.570,00	
30	279/06 I.E.D. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, Sede A (FRANCISCO DE PAULA SANTANDER)	1 RP	\$ 3.652.115.200,00	
31	280/06 I.E.D. FLORIDA BLANCA, Sede A (FLORIDA BLANCA)	1 RP	\$ 3.967.505.720,89	

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

No. Contrato	INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES	REGISTRO PRESUP	TOTAL GENERAL		
			BIRF	CONTRAPARTIDA	
32	281/06	I.E.D. ACACIAS II, Sede A (ACACIAS II)	1 RP	\$ 2.710.637.643,00	
33	282/06	I.E.D. JOHN F. KENNEDY, Sede A (JOHN F. KENNEDY)	1 RP	\$ 5.087.699.090,00	
34	283/06	I.E.D. UNION EUROPEA, Sede A (UNION EUROPEA)	1 RP	\$ 3.503.601.141,00	
35	284/06	I.E.D. EL RODEO, Sede A (EL RODEO)	1 RP	\$ 3.159.111.579,00	
36	290/06	I.E.D. JUAN FRANCISCO MATIZ, Sede C (SURAMERICANA)	1 RP	\$ 2.347.017.359,00	
37	291/06	I.E.D. REPUBLICA DE PANAMA, Sede C (SIMON BOLIVAR)	1 RP	\$ 1.509.727.593,35	
38	292/06	I.E.D. JUAN DEL CORRAL, Sede B (SANTA FE DE BOGOTA)	1 RP	\$ 2.589.259.464,60	
39	307/06	I.E.D. GRANCOLOMBIANO, Sede A (GRANCOLOMBIANO)	1 RP	\$ 2.709.991.973,00	
40	308/06	I.E.D. PILOTO BAVARIA, Sede A (E. N. PILOTO BAVARIA)	1 RP	\$ 2.889.907.958,25	
41	309/06	I.E.D. MANUELA AYALA DE GAITAN, Sede A	1 RP	\$ 3.438.181.445,46	
42	310/06	I.E.D. GUSTAVO RESTREPO, Sede A (GUSTAVO RESTREPO)	1 RP	\$ 2.491.665.465,00	
43	UEL-04-0043-006	I.E.D. JUAN REY Sede A	1 RP		\$ 324.533.090,40
44	UEL-SED 07-035-06	I.E.D. NUEVO CHILE	1 RP		\$ 185.311.459,00
45	UEL-SED-11-038-06	I.E.D. LA AGUADITA	1 RP		\$ 217.104.690,22
46	1169/08	Formar y Acompañar a docentes de colegios en la incorporación de la gestión del riesgo en el PEI	1 RP		\$ 46.000.000,00
47	1171/08	Contratar el recurso humano y la reproducción y distribución de materiales y modelos pedagógicos de gestión del riesgo	1 RP		\$ 31.603.200,00
48	1933/10	Aunar esfuerzos para desarrollar estrategia pedagógica para prevención de riesgos escolares y/o aseguramiento accidentalidad	1 RP		\$ 82.500.000,00
49	77/08	Fortalecer y asesorar el tema de capacitación en riesgos y desastres	1 RP		\$ 12.900.000,00
			TOTALES	\$ 2.274.813.426,18	\$ 364.380.821,05

Fuente: Informe financiero - SED

En la ejecución de recursos correspondiente al componente del Estado de Inversión B.1.1 Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales, se reverso el valor de la amortización de anticipo de los contratos 186/07 por valor de \$85.619 (En miles de pesos) y contrato 178/07 por valor de \$404.937 (En miles de pesos), para un total de \$490.558 (En miles de pesos) en la solicitud de desembolso No. 10 y contrato 242/06 por valor de \$302.448 (En miles de pesos) en el desembolso No. 13, más el valor de \$ 49.227 (En miles de pesos) del contrato 194/2006 que se pagó por fuente crédito BIRF y corresponde a contrapartida, más \$63.270 (En miles de pesos) correspondiente al Contrato UEL-04-0043-006, que se canceló por fuente crédito y que corresponde a contrapartida, valores que se suman al valor de la inversión.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

1.4.1.1.2. Compromisos por pagar B.1.1 mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales.

En el cuadro siguiente se muestran los contratos con sus saldos pendientes, así:

**CUADRO 19
SALDOS DE CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN**

En miles de pesos

COMPONENTE	Contrato/Resolución	Colegio	BIRF	CONTRAPARTIDA	Total general
	1722/10	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL LO CUAL INCLUYE RE		41,954	41,954
	179/07	CED Gustavo Morales Sede A	909,253		909,253
	183/07	CED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE B - GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA - COD. P.F. 715	11,762		11,762
	184/07	CED EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES Sede B- Tomas Jefferson	162,073		162,073
	186/07	CED LUIS LOPEZ DE MESA Sede A	387,051		387,051
	1895/11	San Jose de Castilla	853,714	267,279	1,120,993
	192/06	I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE SEDE B - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		5,925	5,925
	308/06	I.E.D. PILOTO BAVARIA, SEDE A (E. N. PILOTO BAVARIA)	183		183
Total B.1			2,324,036	315,158	2,639,194

Fuente: Informe Financiero BIRF - SED

Con recursos del crédito BIRF se encuentra un saldo pendiente de liquidar de \$2.324.036 mil pesos. El saldo consolidado es de \$2.639.194 ml pesos, correspondiendo esta suma a los contratos que están en procesos de liquidación, del componente B.1.1 Mejoramiento integral de infraestructura, es importante resaltar que la cancelación de estos saldos se efectuará en el momento en que las liquidaciones queden en firme y el pago será con cargo a la fuente recursos propios.

1.4.2. Componente D

1.4.2.1. Educación Del Riesgo

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

La capacitación es uno de los pilares fundamentales de la gestión del riesgo y está orientado fundamentalmente a la comunidad educativa y es una pieza de la estrategia educativa a la comunidad.

Se brinda a los docentes para incorporar la temática de gestión del riesgo en los planes escolares, aporte que brinda la Secretaría de Educación del Distrito y el FOPAE.

D.1.1 Formulación e implementación de una estrategia de información, educación y enlace para la gestión del riesgo en Bogotá.

A través de este proyecto se realiza la conformación de un nodo temático para la investigación del riesgo y el fomento a 1.000 instituciones educativas de Bogotá sobre el plan escolar de emergencias.

D.1.2 Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas

La ejecución de recursos correspondiente al Estado de Inversión componente D.1.2 Educación del Riesgo, fue incluida en la cuenta de Gasto Social que refleja el valor ejecutado por gasto de capacitación en riesgos y desastres, así:

COMPONENTE: Prevención y concientización del riesgo

SUBCOMPONENTE: D.1 Educación del riesgo

D.1.1 Prevención del riesgo

**CUADRO 20
EJECUCION RECURSOS CAPACITACIÓN EN RIESGOS**

Cifras en miles de pesos

No. CONTRATO	OBJETO	2008-2011	
		APORTE LOCAL	TOTAL 2011
1169/08	Formar y Acompañar a docentes de colegios en la incorporación de la gestión del riesgo en el PEI	\$ 46,000	\$ 46,000
1171/08	Contratar el recurso humano y la reproducción y distribución de materiales y modelos pedagógicos de gestión del riesgo	\$ 31,603	\$ 31,603
1933/10	Aunar esfuerzos para desarrollar estrategias pedagógicas en la prevención del riesgo	\$82,500	\$82,500

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

77/08	Fortalecer y asesorar el tema de capacitación en riesgos y desastres	\$ 12,900	\$ 12,900
	TOTAL	\$173.003	\$173.003

Fuente: Informe Financiero SED

Estos recursos fueron ejecutados con presupuesto de la SED. Estos proyectos buscan formar y acompañar docentes en gestión de riesgos, atención de emergencias y fortalecer la gestión del riesgo como cultura preventiva en los colegios oficiales, mediante el acompañamiento, evaluación y el seguimiento de las instituciones educativas en la implementación de un plan escolar para la gestión del riesgo. El mayor porcentaje en la asignación de recursos fue para LAS estrategias pedagógicas en la prevención del riesgo.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

2. ANEXO 1

RECURSOS BIRF – PLAN DE DESARROLLO

AÑO	PROY	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS DEL PROYECTO	COMPONENTE	NOMBRE DE LA META (S) INVOLUCRADAS	RECURSOS INVERTIDOS POR META
2006	312	Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las I.E.D	Crédito: \$19.474.657.311.17 Contrapartida: \$9.475.695.532	Mejoramiento y reforzamiento	42 I.E.D. reforzadas	Crédito: \$9.082.594.000 Contrapartida: \$6.966.497.000
2007	312	Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las I.E.D	Crédito: \$39.219.317.525 Contrapartida: \$9.475.695.522	Mejoramiento y reforzamiento	42 I.E.D. reforzadas	Crédito: \$35.470.423.000 Contrapartida: \$9.475.696.000
2008	312 B.S.I	Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las I.E.D	Crédito: \$39.219.317.525 Contrapartida: \$9.475.695.522	Mejoramiento y reforzamiento	42 I.E.D. reforzadas	Crédito: \$12.653.154.012
2008	563 B+	Construcción y conservación de la infraestructura del sector educativo oficial	Crédito: \$3.467.566.140	Construcción Plantas Físicas	42 I.E.D. reforzadas	
2008	557 B+	Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá	Contrapartida: \$90.503.200	Salud al colegio	Beneficiar a 50.000 estudiantes	Contrapartida: \$90.503.200
2010	557	Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá	Contrapartida: \$82.500.000	Salud al colegio	Beneficiar a 550 estudiantes	Contrapartida: \$82.500.000
2010	563	Construcción y conservación de la infraestructura del sector educativo oficial	Crédito: \$8.021.938.435 Contrapartida: \$825.224.404	Construcción Plantas Físicas	2 I.E.D reforzadas	-
2011	563	Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá	Contrapartida: \$96.205.673	Consultorías	1 consultoría	-
			Crédito: \$825.224.404 Crédito: \$5.786.872.429	Construcción Plantas Físicas	1 I.E.D reforzadas	Contrapartida: \$330.426.068 Crédito: \$5.064.194.439

RECURSOS BID – PLAN DE DESARROLLO

AÑO	PROY	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS DEL PROYECTO	COMPONENTE	NOMBRE DE LA META (S) INVOLUCRADAS	RECURSOS INVERTIDOS POR META
2006	7069	Construcción y dotación de Plantas Físicas Distritales	Crédito: \$34.706.435.325,44 Contrapartida: \$40.570.330.819,01	Construcción de Colegios	Construcción de 20 colegios	Crédito: \$36.368.310.485,38 Contrapartida: \$41.763.356.975,78
2007	7069	Construcción y dotación de Plantas Físicas Distritales	Crédito: \$39.718.425.450 Contrapartida: \$40.369.156.414	Construcción de Colegios	Construcción de 20 colegios	Crédito: \$48.990.596.079,48 Contrapartida: \$34.674.365.306,6
			Crédito: \$13.008.677.192 Contrapartida: \$2.188.130.199	Dotación de colegios	Dotación de 20 colegios	
2007	261	Evaluación de Impacto de la Política Educativa	Crédito: \$80.000.000	Monitoreo		Crédito: \$80.000.000
2007	266	Subsidios condicionados a la asistencia escolar de los jóvenes trabajadores	Contrapartida: \$1.240.000.000	Diseño y operación del programa		Contrapartida: \$1.229.334.612
			Crédito: \$10.562.500.000	Subsidio económico	45.000 beneficiarios	Crédito: \$10.562.500.000
			Crédito: \$3.027.500.000	Subsidio educación superior técnica y tecnológica	830 beneficiarios	Crédito: \$3.027.500.000
2007	283	Dotación y Mejoramiento pedagógico de espacios de aprendizaje	Crédito: \$2.841.000.000	Herramientas de Gestión	20 ambientes de aprendizaje	Crédito: \$7.589.877.941
			Crédito: \$5.020.410.000	Herramientas de Gestión	20 bibliotecas	
2007	273		Contrapartida: \$180.000.000	Programas de formación permanente	600 Docentes de 20 colegios	Contrapartida: \$850.000.000

www.contraloriabogota.gov.co
Código Postal 111321
Carrera 32 A No. 26 A 10
PBX 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

RECURSOS BID – PLAN DE DESARROLLO

AÑO	PROY	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS DEL PROYECTO	COMPONENTE	NOMBRE DE LA META (S) INVOLUCRADAS	RECURSOS INVERTIDOS POR META
		Cualificación y mejoramiento profesional de los maestros y las maestras	Contrapartida: \$290.000.000 Contrapartida: \$500.000.000	Incentivos Acompañamiento a colegios	600 Docentes de 20 colegios 600 Docentes de 20 colegios	
2008	7069	Construcción y dotación de Plantas Físicas Distritales	Crédito: \$131.019.838 Contrapartida: \$1.947.474.263	Construcción de Colegios Dotación de colegios	Construcción de 20 colegios Dotación de 20 colegios	Crédito: \$131.019.838 Contrapartida: \$1.947.474.263
2008 B.S.I	261	Evaluación de Impacto de la Política Educativa	Crédito: \$48.720.000 Contrapartida: \$105.787.500	Monitoreo	Ejecutar Monitoreo	Crédito: \$48.720.000 Contrapartida: \$105.787.500
2008 B+	200	Fortalecimiento de la gestión institucional de la SED	Crédito: \$80.000.000 Contrapartida: \$84.212.500	Herramientas de Gestión	Ejecutar herramientas de Gestión	Crédito: \$92.800.000 Contrapartida: \$138.407.000
2008	266	Subsidios condicionados a la asistencia escolar de los jóvenes trabajadores	Contrapartida: \$327.800.000 Contrapartida: \$129.737.750	Diseño y paralización del programa Subsidio económico	45.000 beneficiarios	Contrapartida: \$327.800.000 Contrapartida: \$129.737.750
2008	290	Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidad en educación superior	Crédito: \$3.048.645.000 Contrapartida: \$409.083.000	Subsidios condicionados a educación superior	830 beneficiarios	Crédito: \$3.048.644.271 Contrapartida: \$408.413.026
2008	283	Dotación y Mejoramiento pedagógico de espacios de aprendizaje		Herramientas de Gestión Herramientas de Gestión	20 ambientes de aprendizaje 20 bibliotecas	
2008 B.S.I	273	Cualificación y mejoramiento profesional de los maestros y las maestras	Contrapartida: \$62.000.000	Programas de formación permanente	600 Docentes de 20 colegios	Contrapartida: \$1.103.000.000
2008 B+	273	Cualificación profesional y ampliación del horizonte cultural de docentes, coordinadores y rectores de los C.O.D.	Contrapartida: \$1.041.000.000	Formación Presencial		
2008 B.S.I B+	552	Transformación pedagógica para la calidad de la educación del sistema educativo Oficial	Contrapartida: \$235.235.000	Evaluación Integral	1 modelo de evaluación integral	Contrapartida: \$235.235.000
2008 B+	557	Apoyo a estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá	Contrapartida: \$100.208.241 Crédito: \$2.343.750.000 Contrapartida: \$2.381.019.009	Susidio de Transporte condicionado a la asistencia escolar Susidio educativo condicionado a la asistencia	45.000 beneficiarios	Crédito: \$2.343.750.000 Contrapartida: \$2.918.964.047
2008 B+	559	Dotación de la infraestructura educativa y administrativa de la SED	Contrapartida: \$100.346.773 Contrapartida: \$50.000.000 Contrapartida: \$407.651.840	Medios audiovisuales y de comunicación Mobiliario Materiales para cultura, deporte y recreación	Dotación para 20 colegios	Contrapartida: \$100.346.773 Contrapartida: \$50.000.000 Contrapartida: \$407.651.840
2009	200	Fortalecimiento de la gestión institucional de la SED	Crédito: \$46.400.000 Contrapartida: \$232.946.000	Herramientas de Gestión	Ejecutar herramientas de Gestión	Contrapartida: \$118.718.667
2009	290	Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidad en educación superior	Contrapartida: \$1.723.224.000	Subsidios condicionados a educación superior	830 beneficiarios	Contrapartida: \$1.723.224.000

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

RECURSOS BID – PLAN DE DESARROLLO

AÑO	PROY	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS DEL PROYECTO	COMPONENTE	NOMBRE DE LA META (S) INVOLUCRADAS	RECURSOS INVERTIDOS POR META
2009	273	Cualificación profesional y ampliación del horizonte cultural de docentes, coordinadores y rectores de los C.O.D.	Contrapartida: \$576.171.000	Formación Presencial	600 Docentes de 20 colegios	Contrapartida: \$576.171.000
2009	195	Evaluación e Incentivos Económicos para promover la calidad de la educación en los C.O.D.	Contrapartida: \$150.000.000	Evaluación integral	1 modelo de evaluación integral	Contrapartida: \$150.000.000
2010	200	Fortalecimiento de la gestión institucional de la SED	Crédito: \$46.400.000 Contrapartida: \$186.700.000	Herramientas de Gestión	Ejecutar herramientas de Gestión	Crédito: \$46.400.000 Contrapartida: \$204.864.575
			Crédito: \$330.000.000	Estudios	1 Estudio	
2010	290	Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidad en educación superior	Crédito: \$893.014.000 Contrapartida: \$2.375.281.000	Subsidios condicionados a educación superior	830 beneficiarios	Crédito: \$893.014.000 Contrapartida: \$2.375.281.000
2010	273	Cualificación profesional y ampliación del horizonte cultural de docentes, coordinadores y rectores de los C.O.D.	Contrapartida: \$62.540.000	Formación Presencial	600 Docentes de 20 colegios	Contrapartida: \$62.540.000
2010	195	Evaluación e Incentivos Económicos para promover la calidad de la educación en los C.O.D.	Contrapartida: \$75.395.000	Evaluación integral	1 modelo de evaluación integral	Contrapartida: \$75.395.000
2010	557	Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá	Crédito: \$244.074.000 Contrapartida: \$148.195.000	Susidio educativo condicionado a la asistencia	Beneficiará 12.000 estudiantes	Crédito: \$244.074.000 Contrapartida: \$148.195.000
2011	200	Fortalecimiento de la gestión institucional de la SED	Crédito: \$630.000.000	Estudios	1 Estudio	
2011	563	Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá	Contrapartida: \$763.109.899 Crédito: 2.796.939.261	Construcción Plantas Físicas	1 Colegio construido	-
2012	200	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	Crédito: \$609.033.425	Estudios	Realizar 1 documento	\$609.033.425 Contrato Evaluación de Impacto Programa Equidad en Educación en Bogotá
			Crédito: \$14.666.400	Estudios	Realizar 1 documento	\$14.666.400 Contrato Auditoria Vigencia 2012
2012	902	Mejor Gestión	Crédito: \$20.966.575	Herramientas de Gestión	Realizar 1 documento	\$20.000.000 Contrato Auditoria Vigencia 2013
2013	262	Hábitat Escolar	Crédito: \$1.300.000.000	Terminación de Colegios inconclusos	Terminación de 1 colegio inconcluso	Crédito: \$1.300.000.000 La meta para el componente es la terminación de 3 colegios inconclusos, pero con recursos del crédito BID la meta es la terminación de 1 colegios inconcluso
2013	902	Mejor Gestión	Crédito: \$20.967.000	Herramientas de Gestión	Realizar 1 documento	No se comprometieron estos recursos ya que eran para contratar la auditoria de la vigencia 2014 y esta se contrató en 2014 con recursos propios.

Fuente: Informes Financieros – SED

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

3. ANEXOS.

3.1. CUADRO DE HALLAZGOS CONSTITUTIVAS DE PRESUNTOS HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR	REFERENCIACION
ADMINISTRATIVOS	2	NA	2.3.1.2; 2.3.5.1
CON INCIDENCIA FISCAL			
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	1	NA	2.3.1.2
CON INCIDENCIA PENAL			
TOTAL HALLAZGOS	2		

FORMATO CODIGO: 4012007
